

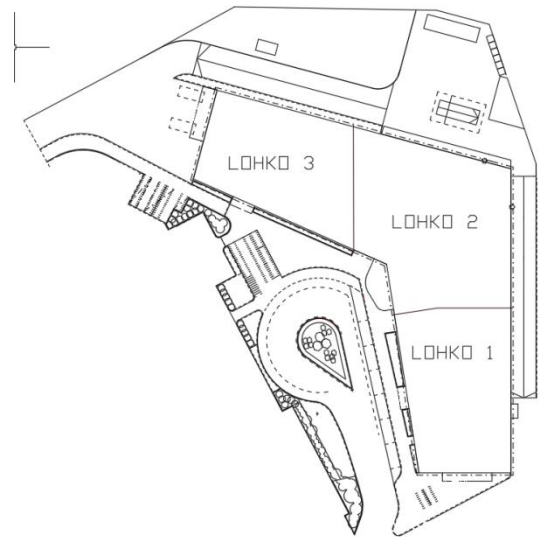
14.6.2019

Työmaa 15525

Varkauden Terveyskampus
Savontie 55,
78300 VARKAUS

Vastaava työnjohtaja:

Ari Tykkyläinen
Lujatalo Oy
044 585 2986

**Käynnissä olevat työvaiheet**

- Sisäpuoliset täyttötöyt, Lohkojen 1 ja 2 välissä
- Ontelokentän rauditustyö, Lohko1/ 1 ker.
- Tukkolaudoitustyöt Lohko1/1ker.

Alkavat työvaiheet

- Elementti asennus Lohko1/2ker.
- Anturoiden vierustäyttötöyt, Lohko 2
- Ontelokentän valutyöt, Lohko1/1 ker.

Muuta

- Kunnallistekniikan liittymien kaivutyöt toteutetaan 15.6 - 16.6.2019. Tämä aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Savontiellä sairaalan kohdalla.

Työturvallisuus

- TR-mittaustulos viikolla 24 oli 97,7%.
- Työmaalla pidetään maanantaisin kello 9:00 työturvallisuusinfo ja viikkopalaveri
